

**UMOWA nr .....**

**zawarta w Rzeszowie dnia ..... czerwca 2010 r.**

**w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”**

pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:  
 Zygmunta Cholewińskiego - Marszałka Województwa Podkarpackiego,  
 Jana Burka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego,  
 zwanym dalej **Liderem Projektu**,

a gminą/miastem .....

reprezentowaną przez: .....

zwaną dalej **Partnerem**,

**zwanymi dalej Stronami.**

Działając na podstawie art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1590 z późn. zm.), a także uchwały Rady Gminy nr ..... z dnia ..... oraz uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XVIII/275/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. i nr XXVI/458/08 z 29 września 2008 r., a w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w wykonaniu postanowień Porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (dalej **Porozumienie**) zawartego przez Strony w Rzeszowie dnia 16 maja 2008r., Strony zawierają Umowę następującej treści:

**§ 1**

**Cel Umowy**

1. Mając na uwadze zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, Strony zdecydowały o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dalej zwanego Projektem poprzez podpisanie oraz wykonanie postanowień tego Porozumienia, w szczególności § 5 do § 8 określających szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji Projektu.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.
3. Strony oświadczają, iż ich intencją jest w możliwie najszerszym zakresie powierzenie Liderowi Projektu upoważnień do działania dla realizacji celów Projektu.
4. Przedmiotem powierzenia jest każda czynność wynikająca z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dotyczących 3. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013” oraz z niniejszej Umowy, należąca do Lidera Projektu, a nie przypisana Umową Partnerowi.
5. Terminy użyte w treści niniejszej Umowy mają znaczenie określone w Porozumieniu.

## § 2

### Okres realizacji Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący:
  - a) okres przygotowania Projektu, to jest do wydania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Decyzji o dofinansowaniu Projektu określającej szczegółowe warunki realizacji Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, zwanej dalej Decyzją;
  - b) okres realizacji Projektu, który będzie określony w Decyzji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku;
  - c) okres trwałości Projektu to jest pięć lat licząc od dnia zakończenia realizacji Projektu.

## § 3

### Oświadczenia Stron o przyjęciu i powierzeniu zadań

1. Partner powierza Liderowi Projektu działanie w swoim imieniu i na swoją rzecz, w tym wykonywanie czynności opisanych w dalszej części Umowy, składających się na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wdrożeniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Strony usług publicznych drogą elektroniczną.
2. Partner upoważnia Lidera Projektu, do działania w swoim imieniu i na swoją rzecz, w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu, w tym między innymi do:
  - a) reprezentowania Partnera wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do złożenia wniosku celem wydania Decyzji;
  - b) zaciągania zobowiązań w zakresie i czasie określonym postanowieniami niniejszej Umowy, przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych w celu realizacji Projektu, zgodnie z artykułem 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  - c) reprezentowania Partnera przed Instytucją Zarządzającą RPO WP 2007-2013 (zwaną dalej IZ);
  - d) koordynowania (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości realizowania poszczególnych zadań objętych Projektem;
  - e) przedkładania wniosków o płatność do IZ celem otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnera oraz rozliczenia wydatków;
  - f) dokonywania zmian warunków realizacji Projektu;
  - g) zarządzania Projektem samodzielnie bądź też poprzez nadzorowanie wyspecjalizowanego podmiotu (Inżyniera Kontraktu).
3. Stosowne pełnomocnictwo w zakresie wskazanym w ust. 2 zostało złożone przez Partnera wraz z podpisaniem niniejszej Umowy. Jednocześnie Partner oświadcza, iż wskazane pełnomocnictwo jest ważne, podpisane przez osobę/osoby do tego uprawnioną/upoważnione oraz nie zostało odwołane.
4. Partner oświadcza, iż została przyjęta w dniu ..... uchwała Rady Gminy/Miasta ..... nr ....., w treści której wyrażono zgodę na zawarcie niniejszej Umowy oraz na udzielenie pełnomocnictwa wskazanego w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Wskazana uchwała obowiązuje i nie została zmieniona do dnia zawarcia niniejszej Umowy.

## § 4

### Zakres powierzenia spraw między Stronami

1. Strony Umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację Decyzji.
2. Do zakresu odpowiedzialności Lidera Projektu należy w szczególności:
  - a) reprezentowanie Partnera przed IZ ;
  - b) opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami;
  - c) przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w ramach Projektu, działając również w imieniu i na rzecz Partnera w oparciu o pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3;
  - d) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnera przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie;
  - e) zarządzanie Projektem samodzielnie bądź też poprzez nadzorowanie wyspecjalizowanego podmiotu (Inżyniera Kontraktu);
  - f) zapewnienie udziału Partnera w konsultacjach projektowych i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
  - g) wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań;

- h) określenie sposobu sprawnej komunikacji z Partnerem oraz IZ;
  - i) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;
  - j) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań Projektu w zakresie dotyczącym Lidera;
  - k) przedkładanie wniosków o płatność do IZ celem otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera i Partnera oraz rozliczenia wydatków;
  - l) informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu;
  - m) koordynację działań związanych z realizacją Projektu na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celach;
  - n) przygotowanie i publikacja ogłoszeń o Projekcie;
  - o) inicjowanie zmian w Projekcie oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w Projekcie do IZ;
  - p) umożliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom;
  - q) udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom.
3. Lider Projektu staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z Decyzji oraz Umowy.
4. Ponadto Lider Projektu zapewnia, kontroluje prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych na realizację Projektu, ponosi odpowiedzialność za działania związane z promocją i informacją w zakresie realizowanego Projektu.
5. Do zakresu odpowiedzialności Partnera należy w szczególności:
- a) aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach mających na celu realizację Projektu, o którym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy;
  - b) informowanie celem uzyskania akceptacji Lidera o planowanych zmianach w harmonogramie realizacji Projektu;
  - c) stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Stronami;
  - d) udzielanie informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem IZ;
  - e) niezwłoczne informowanie Lidera o przeszkodach powstałych w trakcie realizacji Projektu, w tym o ryzyku zaprzestania jego realizacji;
  - f) poddanie się kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowej realizacji zadań w Projekcie przeprowadzanej przez Lidera, IZ oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym:
    - 1) wgląd w dokumenty, związane z realizacją Projektu przez Strony, Audytora, Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu;
    - 2) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji Projektu przez Strony, Audytora, Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu;
    - 3) zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień związanych z realizacją Projektu na każdym etapie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
  - g) udostępnianie każdorazowo na wniosek Lidera lub uprawnionych podmiotów dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych zadań w odniesieniu do celów Projektu i celów RPO WP 2007-2013;
  - h) umieszczanie właściwych oznaczeń na materiałach promocyjnych, informacyjnych związanych z realizacją Projektu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 pkt a niniejszego paragrafu;
  - i) wykorzystywanie materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera;
  - j) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w terminach określonych w Umowie;
  - k) terminowe opłacanie zobowiązań finansowych;
  - l) zapewnienie wymagań technicznych w zakresie uregulowanym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  - m) przedłożenie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie określonych w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.
6. Partner zobowiązuje się do:
- a) przestrzegania obowiązków dotyczących informacji i promocji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym między innymi do:

- 1) umieszczania na swojej stronie internetowej informacji o Projekcie, zgodnie z przepisami dotyczącymi informacji i promocji;
  - 2) udostępniania broszur, ulotek i innych publikacji dotyczących Projektu;
- b) wyznaczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania Decyzji, minimum jednego przedstawiciela, który będzie brał udział w czynnościach związanych z wdrożeniem elementów Projektu, odbioru usług i dostaw realizowanych w ramach Projektu na jego rzecz. Partner zobowiązany jest poinformować pisemnie o upoważnieniu, wskazując imiennie upoważnionego, jak również wszelkie dane kontaktowe. Każda zmiana upoważnionej osoby wymaga bezzwłocznej, pisemnej informacji ze strony Partnera.
- c) zapewnienia udziału w realizacji zadań wynikających z Umowy personelu o odpowiednich kwalifikacjach określonych na etapie realizacji Projektu;
- d) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania IZ o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
7. Czynności odbioru, o którym mowa w ust. 6 pkt b) będą wykonywane zgodnie z harmonogramami ustalonymi w ramach poszczególnych zamówień, o których Lider (bądź w jego imieniu Inżynier Kontraktu) będzie informował Partnera minimum na 7 dni przed datą planowanego odbioru.
8. Partner odpowiada za rzetelne i terminowe przekazywanie Liderowi oraz Inżynierowi Kontraktu informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczenia i raportowania Projektu.
9. Partner zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Lidera dokumentów, związanych z realizacją Projektu, w celu kontroli prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IZ oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kopie przekazywanych dokumentów będą uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem”.
10. Kontrole, o których mowa w ust. 9 mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w okresie realizacji Projektu i trwałości Projektu.
11. W przypadku kontroli przeprowadzanej przez uprawnione podmioty w siedzibie Partnera, zapewni on:
- a) pełny dostęp do wszystkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych związanych z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwi tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
  - b) pełny dostęp w szczególności do urządzeń i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - c) obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat działań związanych z realizacją Projektu.
12. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 9 do 11, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 11 pkt c) w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane, jako odmowa poddania się kontroli.
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu wymagających podjęcia działań naprawczych Lider wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m.in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Partner jest zobowiązany do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Partner nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, Lider dokonuje wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Partnera do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Partnera o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, Lider może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń.
14. Partner zobowiązuje się do współpracy z osobami dokonującymi w imieniu IZ ewaluacji RPO WP 2007-2013 w okresie do 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
15. Strony zobowiązują się do zachowania trwałości Projektu rozumianej, jako nie poddanie Projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz utrzymania rezultatów Projektu w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

16. Strony zobowiązują się do wzajemnego i bieżącego informowania o przebiegu realizacji Projektu i wszystkich istotnych kwestiach wynikłych w trakcie jego wykonywania oraz niezwłocznego powiadamiania o problemach związanych z realizacją Projektu.

## § 5

### Zakres przedmiotowy Projektu

1. Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. Szczegółowy zakres jednostkowego pakietu produktów określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów określonego w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

## § 6

### Plan finansowy oraz zasady zarządzania finansowego

1. Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
  - a) planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera wynosi nie więcej niż ..... złotych,
  - b) wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynosi nie więcej niż:..... złotych, płaci Partner,
  - c) wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera wynosi nie więcej niż:..... złotych, płaci Partner,
  - d) pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera, w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą nie więcej niż ..... złotych.
2. Partner zapłaci również koszty nieobjęte planem finansowym Projektu a wskazane w ust. 6 oraz ust. 13 niniejszego paragrafu.
3. Poniesienie przez Strony wydatków kwalifikowanych w kwocie większej niż określona w Decyzji nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
4. Zasady i tryb przekazywania środków finansowych na realizację Projektu oraz zasady i tryb przekazywania dokumentów określony został w załączniku nr 4 – procedura finansowania, oraz obiegu dokumentów dla Projektu.
5. Partner ma obowiązek:
  - a) pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowanych powstałych w trakcie realizacji Projektu.
  - b) pisemnego poinformowania Lidera o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
  - c) pisemnego informowania Lidera o podleganiu zarządowi komisarycznemu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
  - d) przestrzegania regulacji w zakresie pomocy publicznej;
  - e) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiając identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013”, dostępnymi na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl).
6. Partner oświadcza, że w celu utrzymania rezultatów Projektu w okresie realizacji oraz trwałości Projektu zapewni w szczególności:
  - a) utrzymywanie ubezpieczenia majątkowego majątku (tj. sprzętu oraz licencji typu OEM) zakupionego w ramach Projektu w wartości odnoszącej się do części Partnera. Partner jest obowiązany do okazania Liderowi na jego żądanie aktualnego dokumentu ubezpieczenia. W przypadku braku aktualnego dokumentu ubezpieczenia Lider Projektu będzie uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego na koszt Partnera. Partner upoważnia w tym

- zakresie Lidera do zawarcia wskazanej umowy i zaciągnięcia w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązania finansowego.
- b) zakres ubezpieczenia majątkowego o którym mowa w pkt a), musi zawierać co najmniej ubezpieczenia od pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu po włamaniu oraz celowego uszkodzenia.
  - c) utrzymywanie sprzętu zakupionego w związku z realizacją Projektu w stanie umożliwiającym korzystania z niego w zakresie objętym Umową i celem Projektu w okresie trwałości Projektu.
7. Gdy na etapie wydania Decyzji Partner nie ma prawa odzyskiwania podatku VAT, a takie prawo nabędzie w trakcie realizacji projektu, odsetki od kwoty podlegającej zwrotowi będą naliczane od dnia, w którym Partner nabył prawo do odzyskiwania VAT.
  8. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Partner wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Lider wezwie do zwrotu całości lub części dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni na wskazany rachunek bankowy.
  9. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Partnera.
  10. W sytuacji bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 8 Lider wzywa Partnera do wykupu weksla na kwotę środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości plus odsetki jak w ust. 9.
  11. Wszelkie wydatki w ramach projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne po wydaniu Decyzji, a których poniesienie jest konieczne w celu prawidłowego zrealizowania Projektu, Partner ma obowiązek zgłosić Liderowi, celem wprowadzenia tych wydatków do zapisów Decyzji, jako wydatków niekwalifikowanych.
  12. Strony mogą zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem iż w przypadku zaistnienia takiej sytuacji są one obowiązane w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, zakupić ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję i o parametrach nie gorszych niż sprzedany środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji projektu przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona we wniosku o dofinansowanie, Strona pokrywa różnicę ze środków własnych. Jeżeli środek trwały, zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu Strona jest obowiązana do zwrotu różnicy.
  13. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy ze strony Partnera jest podjęta przez Partnera uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację Projektu oraz wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zał. nr 5) złożone Liderowi w terminie do 30 dni od daty wydania Decyzji.

## § 7

### Zasady komunikacji i przepływu informacji

1. Jeżeli w treści Umowy nie postanowiono inaczej, przepływ informacji między Liderem a Partnerem odbywać się będzie pocztą elektroniczną, faksem lub przez doręczenie osobiste na właściwy adres wskazany przez Strony zgodnie z ustaleniami między Stronami:
  - a) Lider – Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Ciepelińskiego 4, tel. 17-860-6797, fax. 17-860-6727 e-mail. pseap@podkarpackie.pl
  - b) Partner .....
2. Jeżeli będzie to wymagane wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 lub niezbędne do realizacji niniejszej Umowy i Porozumienia, Lider może żądać dostarczenia określonych informacji lub dokumentów w formie przez te przepisy (lub niego) wymaganej, a Partner zobowiązuje się je w tej formie niezwłocznie dostarczyć.
3. Informacja o rozliczeniu wydatkowania przekazanych środków w formie zaliczek będzie przekazywana Partnerowi w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za rok miniony.

## § 8

### Zasady podejmowania decyzji

1. Istotne decyzje dotyczące współdziałania i harmonogramu Projektu podejmuje Lider, po wcześniejszej konsultacji z Komitetem Sterującym Projektu.
2. W pozostałych kwestiach, w zakresie swoich kompetencji Strony podejmują decyzje samodzielnie.

## § 9

### Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w Decyzji w następujących przypadkach:

- a) na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
- b) w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu;
- c) w razie uchylecia Decyzji przez IZ. W takim przypadku Partner jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania na zasadach określonych w Decyzji.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie wytyczne i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a także odpowiednie przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności z ustawy - kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie roszczenia, różnice poglądów lub spory wynikłe na podstawie lub w związku z realizacją Umowy (określane w dalszej części niniejszej Umowy jako „Spór”), rozwiązywane będą na drodze polubownych wysiłków każdej ze Stron.
3. Próba osiągnięcia rozwiązania Sporu uznawana jest za nieudaną natychmiast po tym, jak jedna ze Stron Umowy powiadamia o tym pozostałe strony na piśmie.
4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia Sporu w trybie określonym w ust. 2., Spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Lidera.
6. Zmiany w Umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla Lidera i 1 egzemplarz dla Partnera.

### Załączniki:

Załącznik nr 1 – Minimalne wymagania techniczne

Załącznik nr 2 – Harmonogram finansowy Partnera

Załącznik nr 3 – Zakres jednostkowego pakietu produktów

Załącznik nr 4 – Procedura finansowania oraz obiegu dokumentów dla Projektu PSeAP

Załącznik nr 5 – Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową


Załącznik nr 6 – Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie

.....

.....

.....

Audytory Projektu -> rozliczenia z Audytorem odbywały będą się na takiej samej zasadzie jak z Inżynierem Kontraktu.

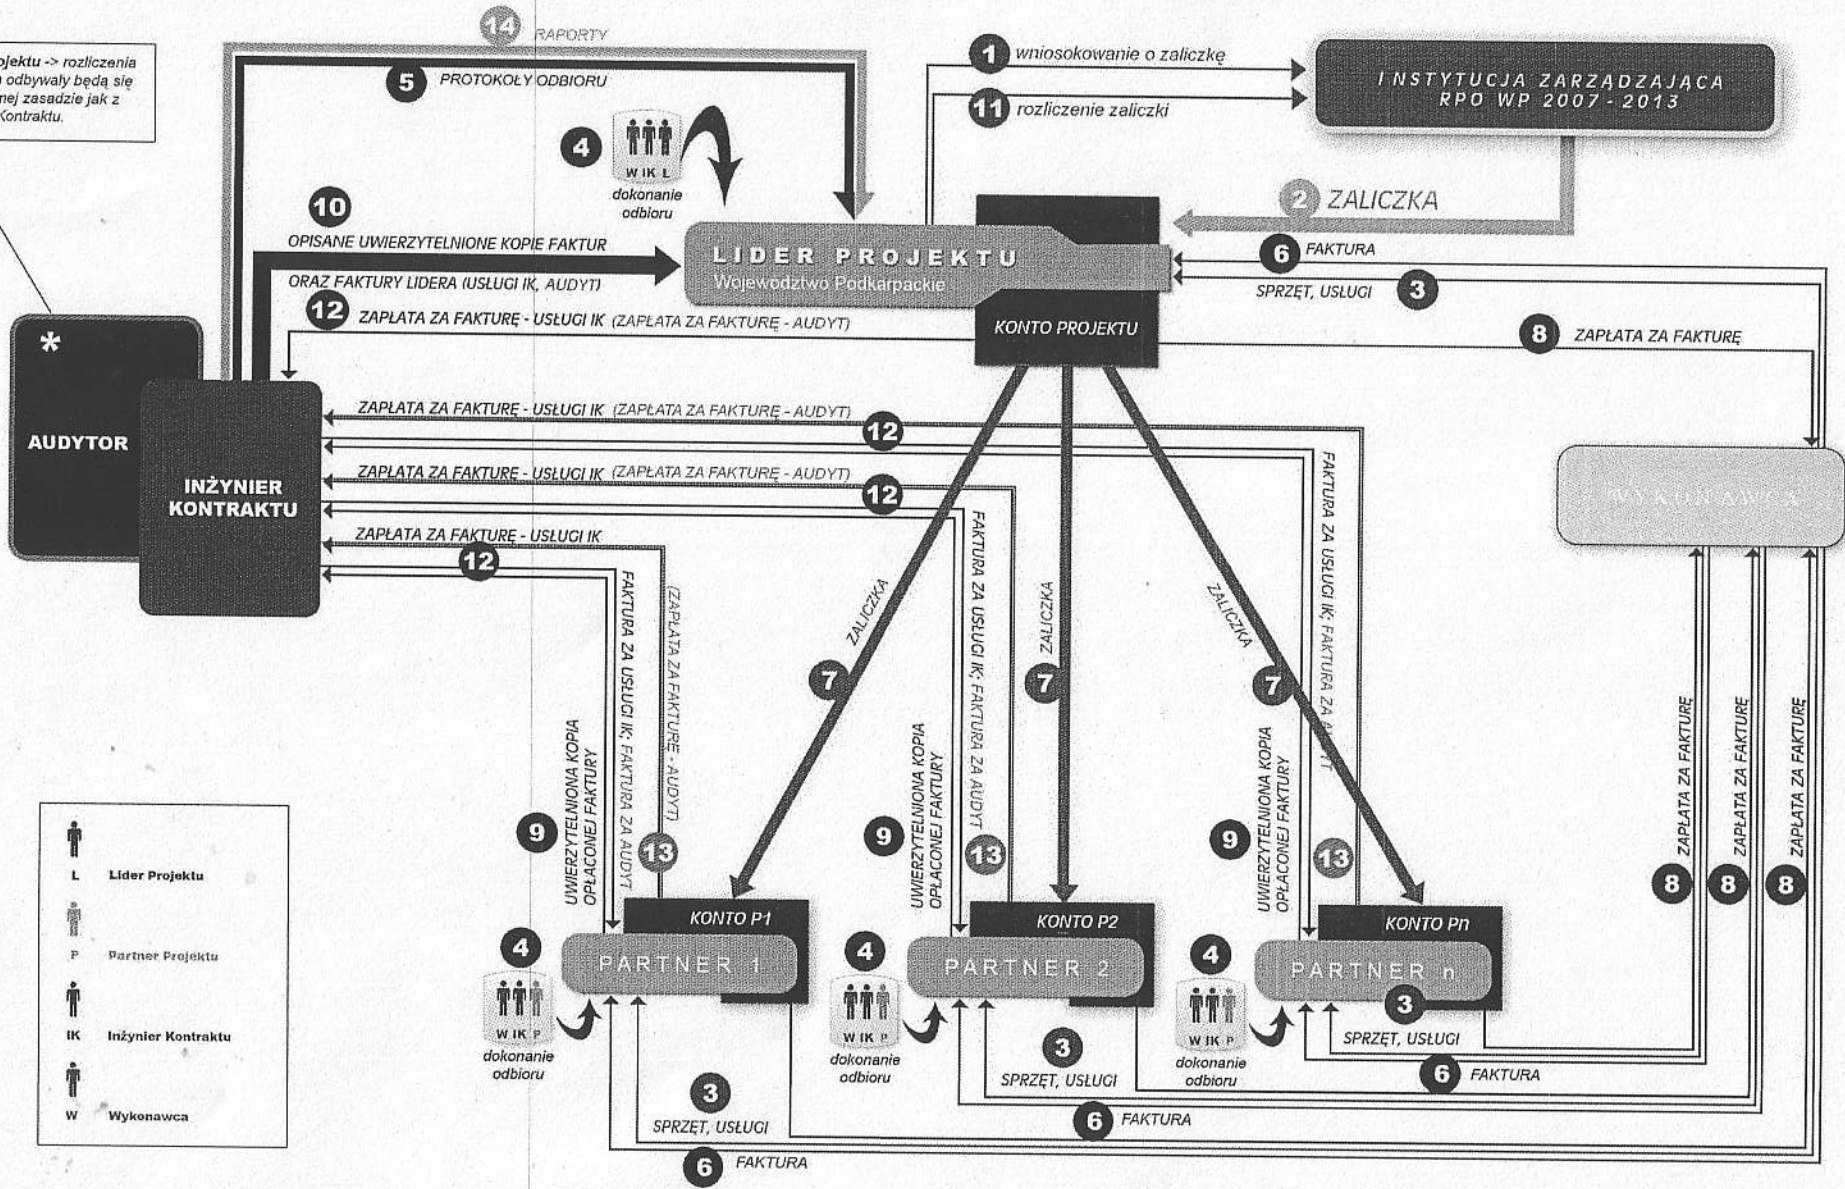

Schemat finansowania z obiegiem dokumentów dla projektu PSeAP - Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej
